

Dabas parka “Engures ezers” tūrisma attīstības plāna ieviešana Pieredze, ko pārņemt, kļūdas, no kurām mācīties



DP “Engures ezers” tūrisma attīstības plāna ieviešana

Pieredze, ko pārņemt, kļūdas, no kurām mācīties

- Dabas parka Engures ezers tūrisma attīstības plāns
- Pozitīvā pieredze
- Negatīvā pieredze
- Kļūdas un problēmas
- Rezultāts



□ Dabas parka Engures ezers tūrisma attīstības plāns

Dabas parkā ietilpst Engures ezers, Rīgas jūras līča piekraste no Mērsraga līdz Engurei un teritorijas ap to.


Administratīvās teritorijas –

2 rajoni (Tukums, Talsi),

4 pagasti (Engure, Zentene, Kūlciems, Mērsrags)

Plāns izstrādāts 2005.-2006.gadā

Aktivitātes plānotas 2006.-2015.gadam

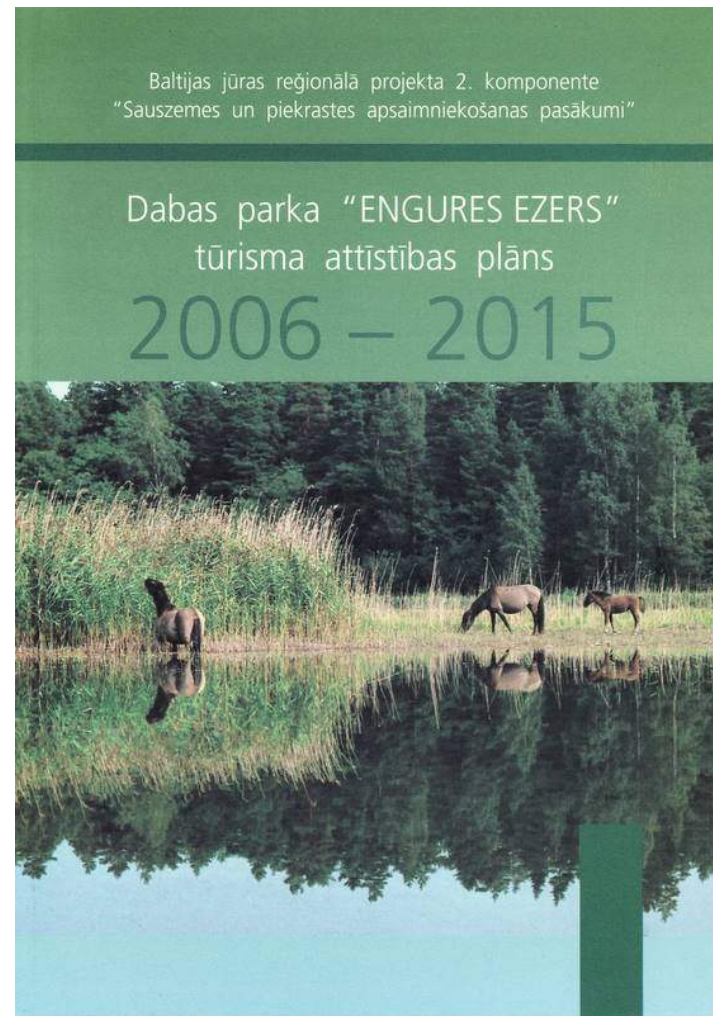

DP “Engures ezers” tūrisma attīstības plāna ieviešana

Pieredze, ko pārņemt, kļūdas, no kurām mācīties

❑ Dabas parka Engures ezers tūrisma attīstības plāns

Tūrisma veidi un pakalpojumi

- Putnu un dzīvnieku vērošana
- Mācību ekskursijas
- Ogošana un sēņošana
- Medības un makšķerēšana
- Laivu noma
- Aktīvā atpūta (uz ūdens, velo noma, laivu noma)
- Jahtu ostas un jahtu tūrisms
- Izbraucieni ar zvejnieku laivām
- Naktsmītnes (ar pirtīm, svinību un semināru telpām)



DP “Engures ezers” tūrisma attīstības plāna ieviešana

Pieredze, ko pārņemt, kļūdas, no kurām mācīties

❑ Dabas parka Engures ezers tūrisma attīstības plāns

Vīzija

EEDP ir populārs Latvijas dabas, vides izziņas un aktīvā tūrisma galamērķis, kur tūrisma attīstība balstīta uz 4 ilgtspējīgas attīstības principiem – vides aizsardzību, teritorijas ekonomisko attīstību, vietējo iedzīvotāju sociālās labklājības celšanu, kā arī sabalansētas un pārdomātas tūrisma attīstības plānošanu.



DP “Engures ezers” tūrisma attīstības plāna ieviešana

Pieredze, ko pārņemt, kļūdas, no kurām mācīties

❑ Dabas parka Engures ezers tūrisma attīstības plāns

Tūrisma attīstības ilgtermiņa mērķi

Infrastruktūra

Tūrisma infrastruktūras tīkla tālāka veidošana un uzturēšana, saglabājot EEDP dabas un kultūrvides unikalitāti

Pieejamība/informācija

Tūrisma iespēju pieejamības nodrošināšana, izveidojot un ieviešot pārdomātu tūrisma informācijas un statistikas sistēmu

Uzņēmējdarbība

Tūrisma uzņēmējdarbības veicināšana teritorijas ekonomiskās attīstības un vietējo iedzīvotāju sociālās labklājības nodrošināšanai

Vide

Vides monitoringa pasākumu kompleksa izveide un realizācija, nodrošinot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu EEDP

❑ Dabas parka Engures ezers tūrisma attīstības plāns

1. Tūrisma infrastruktūras tīkla tālāka veidošana un uzturēšana, saglabājot EEDP dabas un kultūrvides unikalitāti

1. Tūrisma infrastruktūras objektu izveide un uzturēšana

Esošo un nesakārtoto SAV sakārtošana

Jaunas SAV abpus Mērsraga kanālam, laivu bāzē “Briežragi”, laivu bāzē “Dzedri”

Stāvlaukumu izveide pie šosejas

Regulāra objektu apsaimniekošana un monitorings

2. Jaunu dabas tūrisma objektu izveide

Putnu vērošanas slēpņa izveide

Putnu torņa uzstādīšana

Jauno objektu apsaimniekošana un monitorings



DP “Engures ezers” tūrisma attīstības plāna ieviešana

Pieredze, ko pārņemt, kļūdas, no kurām mācīties

□ Dabas parka Engures ezers tūrisma attīstības plāns

1. Tūrisma infrastruktūras tīkla tālāka veidošana un uzturēšana, saglabājot EEDP dabas un kultūrvides unikalitāti

1. Jaunas tūrisma takas un maršruti

*Laipu taka mitrajos mežos pie Dzedrupītes - izveide, apsaimniekošana, **monitorings***

Dabas taka Laidē

*Akmeņu dabas taka pie ezera - izveide, apsaimniekošana, **monitorings***

*Marķēts kājnieku tūrisma maršruts - izveide, apsaimniekošana, **monitorings***

*Marķēts velotūrisma maršruts - izveide, apsaimniekošana, **monitorings***

*Maršruts “Dabas procesu taka” - izveide, apsaimniekošana, **monitorings***

*Laipu taka Bērzciemā uz jūru pie “Mazās kaijas” - izveide, apsaimniekošana, **monitorings***

Aktīvā tūrisma dažādošana (distanču slēpošanas, kaitborda un sērfinga, ledus burāšanas piedāvājums)

Aktīvā tūrisma piedāvājuma pakešu izstrāde (vasarai, ziemei)

□ Dabas parka Engures ezers tūrisma attīstības plāns

1. Tūrisma infrastruktūras tīkla tālāka veidošana un uzturēšana, saglabājot EEDP dabas un kultūrvides unikalitāti

4. Jaunu kultūrtūrisma produktu izveide

Kultūrvēsturisko vietu – objektu, notikumu, teiku vietu utml. apzināšana un pieejamības radīšana tūristiem, jaunu objektu izveide un labiekārtošana

Brīvdabas muzeja izveide Kūļciemā - vietējā dzīvesveida izpēte, tautas celtniecības tradīciju fiksēšana, muzeja plānošana un izveide, piedāvājuma sagatavošana

Vietējā kulinārijas mantojuma izkopšana – recepšu apzināšana, ekspedīcijas un recepšu apguve praktiski, iepazīstināšana ar vietējo ēdienu un iekļaušana sabiedriskajā ēdināšanā

Vietējās valodas izloksnes saglabāšana un piedāvājums – iepazīšanās, gidu apmācība, uzņēmēju apmācības

Tautas amatu tradīcijas – apzināšana, ēku celtniecība brīvdabas muzejā ar amatu demonstrējumiem, niedru pļaušanas un sagatavošana jumtu klāšanai demonstrācijas, sedumu rekonstrukcijas

DP “Engures ezers” tūrisma attīstības plāna ieviešana

Pieredze, ko pārņemt, kļūdas, no kurām mācīties

❑ Dabas parka Engures ezers tūrisma attīstības plāns

1. Tūrisma infrastruktūras tīkla tālāka veidošana un uzturēšana, saglabājot EEDP dabas un kultūrvides unikalitāti

5. Jaunu kultūrtūrisma produktu plānošana

Cariskās Krievijas laika jūrniecības un kuģubūves tradīciju centra izveide Engurē/apkārtnē – tradīciju izpēte, centra ekonomiskā pamatojuma izstrāde, zinātniskā, arhitektoniskā un mākslinieciskā plānošana un izveide

Vēsturisko satiksmes veidu rekonstrukcija EEDP reģionā – reģionā vēsturiski pastāvējušo satiksmes veidu izpēte, zirgu pajūgu un diližansu satiksme kā tūrisma piedāvājums, bānīša dzelzceļa posms (vēsturiskā un ekonomiskā priekšizpēte)



DP “Engures ezers” tūrisma attīstības plāna ieviešana

Pieredze, ko pārņemt, kļūdas, no kurām mācīties

□ Dabas parka Engures ezers tūrisma attīstības plāns

2. Tūrisma iespēju pieejamības nodrošināšana, izveidojot un ieviešot pārdomātu tūrisma informācijas un statistikas sistēmu

1. Tūrisma informācijas sistēmas izveide

Vienotu TIS izveide par teritoriju 12 gb; vienoti TIS apskates objektiem ~ 20 gb; vienoti pārvietojamie TIS uzņēmumos

Tūrisma informācijas punktu izveide Ķūļciemā un EEDPF, nodrošinot to darbību atbilstoši LVS

Tūrisma informācijas centra izveide Bērzciemā – īpašumtiesību sakārtošana, telpu pārprojektēšana, remontdarbi un iekārtošana, TIC darbinieka pieņemšana un darbības nodrošināšana atbilstoši LVS

Ceļazīmju atbilstoši LVS izveide un uzstādīšana uz apskates objektiem un uzņēmumiem

6. Ilgtspējīgas tūrisma informācijas nodrošināšana

Videi draudzīgas ceļošanas principi – ievietošana visu veidu tūrisma informācijās, informācijas zīmes par ierobežojumiem, ‘cēloņu-seku’ informācijas zīmes

Ilgtspējīgas attīstības semināru organizēšana par videi draudzīgu tūrismu un aktualitātēm

DP “Engures ezers” tūrisma attīstības plāna ieviešana

Pieredze, ko pārņemt, kļūdas, no kurām mācīties

□ Dabas parka Engures ezers tūrisma attīstības plāns

2. Tūrisma iespēju pieejamības nodrošināšana, izveidojot un ieviešot pārdomātu tūrisma informācijas un statistikas sistēmu

1. Mārketinga stratēģija EEDP tūrisma piedāvājumam

Reklāmas materiāli – flajeri -->bukleti --> kartes; tūrisma produktu brošūras; tūrisma maršrutu brošūras ar kartēm

Elektroniskā tūrisma informācija – EDP mājas lapas uzlabošana tūristiem; info svešvalodās; informācijas aktualitātes nodrošināšana, CD par tūrisma iespējām

Populārzinātniskā informācija – grāmata LV un svešvalodās, CD par EEDP izdošana

Izglītojošie pasākumi ceļotājiem – Putnu dienas, pavasara un rudens talkas, putnu būrīšu gatavošanas akcijas

6. EEDP teritorijas un reģiona tūrisma pētījumi

Tūrisma aktualitāšu komplektēšana un iekļaušana piedāvājumos; tūrisma statistikas sistēmas izveide un ievākšana, apkopošana; tūrisma tendenču pētījumi – kvalitatīvi un kvantitatīvi par EEDP u.c. līdzvērtīgiem DP; tūrisma uzņēmēju datu bāze

❑ Dabas parka Engures ezers tūrisma attīstības plāns

3. Tūrisma uzņēmējdarbības veicināšana teritorijas ekonomiskās attīstības un vietējo iedzīvotāju sociālās labklājības nodrošināšanai

1. EEDP fonda administrācijas kapacitātes celšana

Tūrisma speciālista pieņemšana EEDPF un darbības nodrošināšana

Apmeklētāju maksas ieviešana atsevišķos EEDPF izveidotajos objektos (Orhideju taka, ekskursijas maksas grupām, putnu vērošanai ar EEDPF stacionārajiem tālskatiem)

Tūrisma attīstības plāna leģitimēšana

Papildus finanšu piesaiste tūrisma attīstības plāna realizācijai

6. Tūrisma uzņēmējdarbības aktivizēšana

Tūrisma uzņēmējdarbības kvalitātes nodrošināšana – apsekojumi (1x gadā), sertificēšanās

Uzņēmēju apmācības – dažādas apmācību programmas pēc nepieciešamības

Neformāls tūrisma uzņēmēju klubs ar kopīgām aktivitātēm

□ Dabas parka Engures ezers tūrisma attīstības plāns

4. Vides monitoringa pasākumu kompleksa izveide un realizācija, nodrošinot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu EEDP

1. Pētījumi par vides kapacitāti

Web kameru uzstādīšana Orhideju takā un vides monitorings

Vairāk apmeklēto objektu izvēle un novērošana, apmeklētāju uzskaite un to radīto ietekmju fiksēšanas metodika, fiksēšana, paredzēšana un novēršana

Pētījumi par vides kapacitāti dažādos EEDP objektos – jūtīgāko objektu izvēle un novērošana, apmeklētāju uzskaite un to radīto ietekmju fiksēšanas metodikas izstrāde un realizācija

5. Tūrisma radīto negatīvo seku ietekmju un seku novēršana

Katra atsevišķa gadījuma fiksēšana un klasifikācija tālākai izpētei par biežākajiem ietekmju veidiem, to novēršanas eventūālajiem pasākumiem

Fiksēto tūristu radīto negatīvo ietekmju gadījumu novēršanas sistēmas izstrāde un ieviešana

DP “Engures ezers” tūrisma attīstības plāna ieviešana


Pieredze, ko pārņemt, kļūdas, no kurām mācīties

☐ Pozitīvā pieredze

1. Sadarbība
2. Detalizēta plānošana
3. Oriģinālas idejas
4. Griba strādāt kopā

☐ Negatīvā pieredze

1. Sadarbība apsīka
2. Plāna realizācija no tā ieviesēju puses netiek veikta
3. Griba strādāt kopā nav realizējusies
4. Oriģinālas idejas ar laiku nekļūst oriģinālas – citi tās ar laiku nozog

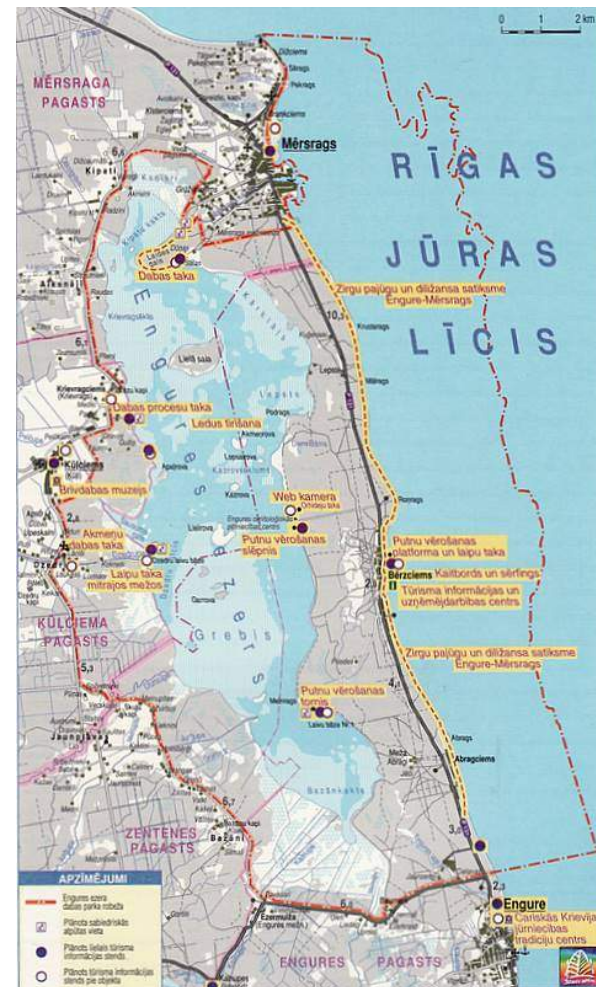

DP “Engures ezers” tūrisma attīstības plāna ieviešana

Pieredze, ko pārņemt, kļūdas, no kurām mācīties

❑ Kļūdas un problēmas

1. Netika līdz galam veikta plāna leģitimēšana
2. Sadarbības veicināšanai jābūt kādam **nepārtrauktajam** ierosinātājam
3. Nevēlēšanās strādāt kopā, ja negūst personīgā biznesa labumu, pasivitāte
4. Joprojām tiek ievērots teritoriālais princips
5. **Pārāk augsta latiņa**

❑ Rezultāts

1. **Atsevišķi spēlētāji** EEDP veido par vienotu galamērķi un strādā ar plānu
2. Piešķir **bonusa** punktus projektu un finanšu pieteikumos (EDEN, LAD projekti, kredīti)
3. **Labs mārketinga instruments**
4. Parka piedāvājums nav mainījies – ne ar ko neatšķiras no citiem līdzīgiem piedāvājumiem
5. Nav izmantotas visas spēcīgās parka īpašības

DP “Engures ezers” tūrisma attīstības plāna ieviešana

Pieredze, ko pārņemt, kļūdas, no kurām mācīties



Paldies par uzmanību!

Ingrīda Smuškova,

Tukuma rajona padomes Reģionālās attīstības centra un Tūrisma informācijas centra vadītāja
